


Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des chaînes d'approvisionnement légales et durables (LSSC)

Évaluation Ex-Post
Projet PP-A/53-323 (ITTO-LSSC-Japan)

AGENCE D'EXECUTION : RIFFEAC
Budget : 315 789 USD

PAYS D'IMPLEMENTATION

Cameroun - Gabon - Centrafrique - RD Congo - Rep. Congo



Consultant : Jean Marcial BELL
Date : Octobre 2025
Partenaires : OIBT – RIFFEAC – COMIFAC



ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX



Informations de base du projet




ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX

 **Objectif :** Assurer la conformité des produits bois du Bassin du Congo aux exigences internationales sur les LSSC.

 **Résultats attendus :**

- Élaboration d'un module unique de formation LSSC.
- Renforcement des capacités des acteurs clés (administrations, entreprises, institutions, OSC).

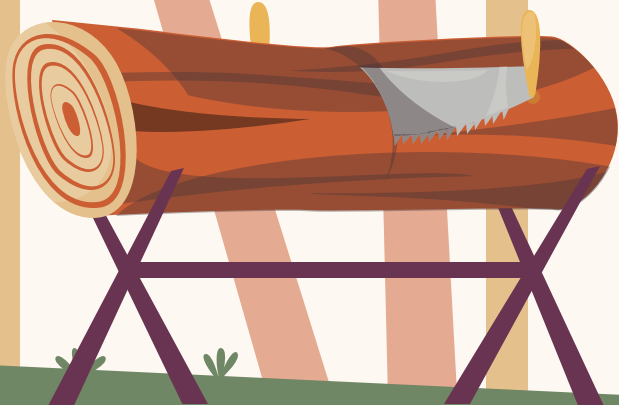

 **Principales parties prenantes :** RIFFEAC, COMIFAC, administrations forestières, institutions de formation, secteur privé, OSC.

Portée et démarche de l'évaluation ex-post



ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX

-  Revue documentaire technique et financière du projet.
-  Entretiens avec près de 100 acteurs dans 5 pays.
-  60 questionnaires administrés aux bénéficiaires et décideurs.
-  Analyse de la pertinence, efficacité, impact et durabilité du projet.

Actions planifiées VS réalisées



ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX



Produits attendus :

- Produit 1 : Module de formation unique –  100 % réalisé
- Produit 2 : Renforcement des capacités –  75 % atteint

Les ateliers nationaux de formation ont eu lieu dans les 5 pays, mais la diffusion postérieure du module n'a pas eu lieu faute de suivi et de financement.

Le module n'a été diffusé qu'en version électronique, limitant sa vulgarisation.

💪 Environ 80 acteurs formés, avec un impact positif sur les pratiques « sans déforestation » et la planification durable.

⚠️ Limites :

- Absence de stratégie post-projet.
- Faible restitution des formations.
- Manque de ressources financières et institutionnelles.
- Résistance locale et contraintes politiques.

➡ Résultat : un succès technique mais un effet multiplicateur limité.

Leçons apprises et conclusions



ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX

- 💡 Importance d'un mécanisme de suivi post-formation.
- 📖 Nécessité d'adapter et d'actualiser régulièrement les modules (Ex. RBUE → RDUE).
- 🎓 Intégration dans les programmes de formation initiale et continue.
- 💛 L'impact durable dépendra de la remobilisation du module et du renforcement des partenariats régionaux.



À l'OIBT :

- Financer la remobilisation et la diffusion du module.

Au RIFFEAC :

- Actualiser le module selon les contextes nationaux ;
- Renforcer le suivi-évaluation avec des indicateurs mesurables ;
- Consolider la collaboration avec les institutions membres et les projets (ex. ADEFAC).

À la COMIFAC et aux institutions de formation :

- Intégrer le module dans les formations continues ;
- Organiser des séminaires de vulgarisation et d'appropriation.

 **Perspectives :** Création d'une plateforme régionale d'échanges sur les LSSC.

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION



ITTO

ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX

La formation au cœur...



...de la gestion durable

