



**ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MADERAS
TROPICALES**



ASOCIACION CENTRO MAYA

INFORME FINAL DE EJECUCION DE PROYECTO

PPD 117/05 Rev.2 (I,M)

**“DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVÉS DE LA
ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE
NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA,
PETEN, GUATEMALA”**

Santa Elena, Peten, Febrero de 2,009

CONTENIDO

1.	Identificación del proyecto.....	2
2.	Período cubierto por este informe	2
3.	Descripción del trabajo realizado en este periodo (1/2 página)	2
4.	Ejecución del plan de trabajo.....	3
4.1	Análisis del plan de trabajo.....	3
4.2	Progreso alcanzado en la ejecución de las actividades.....	4
4.3	Insumos aplicados.....	8
4.4	Resultados logrados.....	14
5.	Análisis crítico del progreso alcanzado en el proyecto	14
6.	Conclusiones.....	14
7.	Funcionario responsable del informe	15
	Anexo: Informe Contables.	16

1. Identificación del proyecto

- 1.1 Nombre: "DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVÉS DE LA ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, PETEN, GUATEMALA"
- 1.2 Número de serie: PPD 117/05 Rev.2 (I,M)
- 1.3 Organismo ejecutor: Asociación Centro Maya
- 1.4 Gobierno(s) anfitrión (es): /Gobierno de Guatemala
- 1.5 Fecha de inicio: 07 Agosto/2,008
- 1.6 Duración (meses): 2 meses
- 1.7 Costo del proyecto (US\$): 54,000

2. Período cubierto por este informe

Del 08 Agosto/2,008 al 15 Diciembre/2008

3. Descripción del trabajo realizado en este período (1/2 página)

El trabajo realizado durante el período de informe gira principalmente a las actividades planificadas y descritas en el preproyecto.

Se dio inicio con la contratación de la firma consultora a través de un contrato formal y legal definiendo claramente las responsabilidades de ellos y de La Asociación Centro Maya durante la ejecución del mismo.

Se procedió a la planificación conjunta de la ejecución de la fase de campo y gabinete para dar inicio a la recopilación de los insumos necesarios para la elaboración de la propuesta.

Se inició con la estructuración de la línea base del proyecto, lo que incluye . Recopilación de Información Secundaria, Realización de un sondeo socioeconómico basal de las organizaciones del área del proyecto con la participación activa de los productores, Realización de un diagnóstico empresarial del bloque de organizaciones propuestas con la participación activa de los productores Y la Socialización de los resultados de los estudios de línea base (socioeconómico y empresariales) a los productores y su retroalimentación.

Paralelamente, el equipo consultor junto con el personal asignado por Asociación Centro Maya, realizó la ejecución de los siguientes componentes:

A- Desarrollo de Procesos:

- Diagnóstico socioeconómico basal;
- Diagnóstico empresarial;
- Socialización de resultados;
- Identificación de iniciativas de investigación y desarrollo;
- Metodologías para la ejecución de inventarios forestales;
- Identificación de técnicas adecuadas de aprovechamiento forestal;
- Revisión de los sistemas de monitoreo;
- Estimación de la capacidad productiva de las comunidades.

B - Proceso de Fortalecimiento Institucional Organizacional estructurado y Estrategias de identificación y contacto de Mercados Locales y Regionales

- a) Estimación de la capacidad productiva de las comunidades sobre la base de volúmenes Aprovechables para el mercado de maderas tropicales primarias y secundarias y recursos no

- Maderables a mediano y largo plazo para promover su comercio
- b) Identificación el potencial de empresas o inversionistas para promover alianzas para la Transformación y comercialización de las diferentes especies de madera
- c) Elaboración de la propuesta en este componente

Con esta información, se proveyeron los insumos necesarios para elaborar la propuesta final, la cual fue sometida a juzgamiento para su análisis y aprobación a través del punto focal en Guatemala que es INAB el 24 Noviembre de 2,008.

4. Ejecución del plan de trabajo

4.1 Análisis del plan de trabajo

RESULTADO / ACTIVIDAD	EJECUCION						
Contratación de Consultores y Expertos							
R1. <u>Una propuesta de proyecto para que los productores</u> del área de influencia del proyecto puedan organizarse empresarialmente y coordinarse para lograr una mejor ordenación de los bosques tropicales.							
A1. Recopilación de Información Secundaria							
A2. Realización de un sondeo socioeconómico basal de las organizaciones del área del proyecto con la participación activa de los productores							
A3. Realización de un diagnóstico empresarial del bloque de organizaciones propuestas con la participación activa de los productores							
A4. Socialización de los resultados de los estudios de línea base (socioeconómico y empresariales) a los productores y retroalimentación							
A5. Elaboración del proyecto en este componente							
R2. <u>Una propuesta de desarrollo de procesos</u> de investigación y el desarrollo productivo e industrial para mejorar la ordenación de los bosques y el eficiente aprovechamiento de los productos maderables y no maderables establecido y operando.							
A1. Consulta e Identificación de iniciativas de investigación y desarrollo							
A2. Revisión de las metodologías y proyecciones en la ejecución de inventarios forestales y los Planes de ordenamiento Forestal de las unidades de manejo							
A3. Cuantificación e identificación de la aplicación de prácticas adecuadas de aprovechamiento forestal sostenible incluyendo la extracción de impacto reducido.							
A4. Revisión de los sistemas de Monitoreo y Evaluación ejecutados en la zona propuesta							
R3. <u>Un Proceso de Fortalecimiento Institucional Organizacional estructurado y Estrategias de identificación y contacto de Mercados Locales y Regionales serán propuestas</u> para mejorar la comercialización y la distribución <u>de las ventas</u> de							

maderas tropicales, dándoles mayor valor agregado									
A1. Estimación de la capacidad productiva de las comunidades sobre la base de volúmenes aprovechables para el mercado de maderas tropicales primarias y secundarias y recursos no maderables a mediano y largo plazo para promover su comercio									
A2. Identificación el potencial de empresas o inversionistas para promover alianzas para la transformación y comercialización de las diferentes especies de madera									
Elaboración de la Propuesta del proyecto									

Durante el proceso de ejecución de las actividades de los componentes R1, R2 y R3, se identificó la necesidad de realizar dos mesas de negocios: a) una mesa de negocios con las empresas locales y nacionales, para consensuar y explorar la posibilidad real de tener alianzas para la transformación y comercialización de la madera. b) Una mesa de negocios con Inversionistas Nacionales y Extranjeros para explorar el interés de participar en la industria forestal local propuesta. Fuera de ello, el plan de trabajo se ejecutó como fue planificado.

4.2 Progreso alcanzado en la ejecución de las actividades

PROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I,M)

RESULTADO/ACTIVIDAD	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
Objetivo de desarrollo Elaborar una propuesta para desarrollar acciones concretas de fortalecimiento Institucional en las organizaciones de productores a través del desarrollo de la cadena productiva forestal local vinculada a procesos de provisión de insumos, producción forestal bajo manejo (incorpora protección biofísica y legal), transformación y encadenamientos comerciales de la madera y productos no maderables hasta el consumidor final.	1 propuesta plasmada en documento impreso de propuesta de proyecto entregado en Peten. 1 Documento Digital en formato MS Word 2003 o más reciente.	Propuesta Enviada a comité de evaluación y carta de Aval del punto Focal.	100
Objetivo Específico Enfocar y orientar estrategias y acciones de desarrollo empresarial de las organizaciones de productores estructuradas en planes de negocios, para el desarrollo de la cadena	1 plan de negocios integral de las organizaciones involucradas en el PNSL 1 plan de negocios para cada organización del PNSL involucrada	Documento de Plan de negocios Integral en sección de documentos de soporte.	

productiva forestal local y aumentar sus ingresos económicos y activar la economía local, mejorando su capacidad productiva forestal bajo manejo y la transformación de los diversos productos del bosque, su capacidad administrativa y gerencial, el mercadeo, la negociación y las ventas.			100
R1. Una propuesta de proyecto para que los productores del área de influencia del proyecto puedan organizarse empresarialmente y coordinarse para lograr una mejor ordenación de los bosques tropicales.	1 procedimiento establecido de organización empresarial legal y fiscal para cada organización 1 mecanismo definido de coordinación e integración comercial de las organizaciones involucradas	Documento de Informe de Fortalecimiento y empresa	100
A1. Recopilación de Información Secundaria	1 Base de datos sistematizada de la información actualizada del PNSL	Informes elaborados adjuntos en documentos de soporte.	100
A2. Realización de un sondeo socioeconómico basal de las organizaciones del área del proyecto con la participación activa de los productores	1 método/herramienta validado de exploración y apreciación rápida de la situación socioeconómica del PNSL en Petén	Documento de Informe de Diagnóstico Socioeconómico en sección de documentos de soporte de archivos enviados	100
A3. Realización de un diagnóstico empresarial del bloque de organizaciones propuestas con la participación activa de los productores	1 método/herramienta validado que ilustre la situación actual empresarial de las comunidades del PNSL en Petén	Documento de Informe de Diagnóstico Empresarial en sección de documentos de soporte de archivos enviados	100
A4. Socialización de los resultados de los estudios de línea base (socioeconómico y empresariales) a los productores y retroalimentación	1 presentación de los resultados a nivel de cada organización de lo obtenidos en los sondeos socioeconómicos y diagnóstico empresarial	Documento de Informe de Socialización de estudios de línea base y socialización de la concepción, diseño y operación de la empresa forestal comunitaria	100
A5. Elaboración del proyecto en este componente	1 capítulo específico de este componente plasmado en el documento impreso y Digital entregado a la ACM en Petén.	Documento de Informe de Fortalecimiento y empresa y Propuesta Final	100
R2. Una propuesta de desarrollo de procesos de investigación y el desarrollo productivo e industrial para	1 actualización cartográfica de cada unidad de manejo en PNSL.	MAPAS incluidos en archivos Documento de Informe de	

mejorar la ordenación de los bosques y el eficiente aprovechamiento de los productos maderables y no maderables establecido y operando.	1 Estrategia que incluya los componentes de investigación y desarrollo productivo y industrial para las organizaciones del PNSL, PETEN.	Investigación (Sección Documentos de Soporte en archivos enviados)	100
A1. Consulta e Identificación de iniciativas de investigación y desarrollo	1 método/herramienta validado de exploración y apreciación rápida de la s necesidad e investigación y desarrollo productivo e industrial	Informes de Investigación.	100
A2. Revisión de las metodologías y proyecciones en la ejecución de inventarios forestales y los Planes de ordenamiento Forestal de las unidades de nanejo	2 métodos alternativos de ejecución de inventarios y planes de ordenamiento forestales en las organizaciones del PNSL, Petén	Documento de Métodos de Inventarios Forestales (Sección Documentos de Soporte en archivos enviados)	100
A3. Cuantificación e identificación de la aplicación de prácticas adecuadas de aprovechamiento forestal sostenible incluyendo la extracción de impacto reducido.	1 Mapa actualizado de las zonas de aprovechamiento (pasadas y futuras) 1 inventario de prácticas utilizadas en los 5 últimos aprovechamientos	Mapas incluidos Digitales y ortofotos en archivos Documento de Informe de las metodologías de inventarios forestales (en sección de documentos de soporte) Documento de Informe de las Practicas de aprovechamientos actuales	100
A4. Revisión de los sistemas de Monitoreo y Evaluación ejecutados en la zona propuesta	1 método alternativo de seguimiento y evaluación propuesto para la zona del PNSL en Petén.	Documento de Informe de M&E ejecutados en la zona y propuesta del Sistema MER (Sección Documentos de Soporte en archivos enviados)	100
<u>R3. Un Proceso de Fortalecimiento Institucional Organizacional estructurado y Estrategias de identificación y contacto de Mercados Locales y Regionales serán propuestas</u> para mejorar la comercialización y la distribución <u>de las ventas</u> de maderas tropicales, dándoles mayor valor agregado	1 estructura organizacional de tipo funcional que involucre también elementos mercadológicos	En Documento de Plan de Negocios (sección documentos de soporte en documentos enviados)	100
A1. Estimación de la capacidad productiva de las comunidades sobre la base de volúmenes aprovechables	1 pronóstico de cosecha como instrumento de negociación en mercados locales, regionales e	Documento de Plan de Negocios y hojas electrónicas con nombre: Volumen a utilizar por	

<p>para el mercado de maderas tropicales primarias y secundarias y recursos no maderables a mediano y largo plazo para promover su comercio</p>	<p>internacionales, cada una de las organizaciones involucradas en el PNSL, Petén, así como un catálogo comercial con fotografías y especificaciones de las maderas y/o productos comerciales ofrecidos por las cooperativas.</p> <p>1 integración de pronósticos de todas las organizaciones como instrumento de negociación en mercados locales, regionales e internacionales, cada una de las organizaciones involucradas en el PNSL, Petén, incluyendo también los catálogos comerciales con fotografías y especificaciones de las maderas y/o productos comerciales ofrecidos por las cooperativas.</p> <p>Lista de Contactos de Mercado con sus respectivos datos y sugerencias de especificaciones de compra.</p>	<p>producto, flujos de caja adjuntas en documentos de soporte</p> <p>Documentos de informe de Capacidad Productiva Madera.</p> <p>Catálogos de fotos en Documento actualmente en la Asociación Centro Maya.</p> <p>En plan de negocios.</p>	<p>100</p>
<p>A2. Identificación el potencial de empresas o inversionistas para promover alianzas para la transformación y comercialización de las diferentes especies de madera</p>	<p>3 empresas nuevas exportadoras de productos transformados identificadas y comprometidas a iniciar acuerdos comerciales con las organizaciones involucradas en PNSL, Petén.</p>	<p>En plan de negocios: Sección Contactos de Mercado para productos maderables y no maderables.</p>	<p>100</p>
<p>A.3 Elaboración de la propuesta en este componente</p>	<p>1 capítulo específico de este componente plasmado en el documento impreso y Digital entregado a la ACM en Petén.</p>	<p>Documento de Plan de Negocios con flujos de Caja Incluidos de productos maderables y no maderables</p>	<p>100</p>

Nota: En el resultado específico, se decidió, realizar solo el plan integral, pues no tenía ningún sentido fragmentar el volumen y los ingresos totales, dado que el enfoque de fortalecimiento es aprovechar la integración de las comunidades para poder aprovechar las economías de escala y negociar en bloque para obtener mejores oportunidades.

4.3 Insumos aplicados

Fuente: OIMT

ASOCIACION CENTRO MAYA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANUAL DEL PROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.)

PERIODO 12 DE AGOSTO DEL 2,008 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2,008

DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVES DE LA ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DELA BIOSFERA MAYA, PETEN, GUATEMALA

	COMPONENTES PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO OIMT US\$	TRANSFERENCIA OIMT	PRESUPUESTO ACTUAL OIMT
10	Personal del Proyecto			
	Expertos Nacionales (3)	\$ 24,500.00		\$ 24,500.00 ✓
	Consultores Nacionales (2)	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00 ✓
	Consulta Internacional (1)	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00 ✓
	Otra Mano de Obra (5)	\$ 1,200.00		\$ 12,000.00 1,200.00 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 38,200.00		\$ 38,200.00 ✓
20	Subcontraros			
30	Viajes de Servicios			
	Viaticos	\$ 3,040.00		\$ 3,040.00 ✓
	Viajes Internacionales	\$ 700.00		\$ 700.00 ✓
	Gastos de Transporte	\$ 2,160.00		\$ 2,160.00 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00
50	Bienes Fungibles			
	Servicios/combustible	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00 ✓ <i>OK NOZ</i>
	Suministros de Oficina	\$ 300.00		\$ 300.00 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 800.00		\$ 2,300.00
60	Gastos Varios			
	Gastos Diversos	\$ 2,600.00	\$ (1,500.00)	\$ 1,100.00 ✓ <i>OK NOZ</i>
	Imprevistos (5% de Costos totales)	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 5,100.00		\$ 3,600.00
70	Admon, Control y Evaluacion de la OIMT	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00 ✓
100	TOTAL GLOBAL	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00 ✓

ASOCIACION CENTRO MAYA

GASTOS EFECTUADOS DEL PROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.)

PERIODO 12 DE AGOSTO DEL 2,008 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2,008

DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVES DE LA ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DELA BIOSFERA MAYA, PETEN, GUATEMALA

	COMPONENTES PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO OIMT US\$	EJECUCION OIMT US\$	SALDO OIMT US\$
10	Personal del Proyecto			
	Expertos Nacionales (3)	\$ 24,500.00		
	Consultores Nacionales (2)	\$ 5,000.00		
	Consulta Internacional (1)	\$ 7,500.00	\$ 37,000.00	\$ -
	Otra Mano de Obra (5)	\$ 1,200.00	\$ 1,189.19	\$ 10.81
	TOTAL COMPONENTE	\$ 38,200.00	\$ 38,189.19	\$ 10.81 ✓
20	Subcontraros			
30	Viajes de Servicios			
	Viaticos	\$ 3,040.00	\$ 2,844.98	\$ 195.02 ✓
	Viajes Internacionales	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00 ✓
	Gastos de Transporte	\$ 2,160.00	\$ 2,025.54	\$ 134.46 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 5,900.00	\$ 4,870.52	\$ 1,029.48 ✓
50	Bienes Fungibles			
	Servicios/combustible	\$ 2,000.00	\$ 2,320.68	\$ (320.68) ✓
	Suministros de Oficina	\$ 300.00	\$ 178.73	\$ 121.27 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 2,300.00	\$ 2,499.41	\$ (199.41) ✓
60	Gastos Varios			
	Gastos Diversos	\$ 1,100.00	\$ 1,066.61	\$ 33.39 ✓
	Imprevistos (5% de Costos totales)	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00 ✓
	TOTAL COMPONENTE	\$ 3,600.00	\$ 1,066.61	\$ 2,533.39 ✓
70	Admon, Control y Evaluacion de la OIMT	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
				46,625.73
100	TOTAL GLOBAL	\$ 54,000.00	\$ 50,625.73	\$ 3,374.27

COMPOSICION DE SALDOS

SALDO POR EJECUTAR	\$ 3,374.27
(-) IMPREVISTOS	\$ 2,500.00

Total disbursement to EA \$ 47,500

Balance \$ 874.27

↓
Refund on 2 Feb 2009
(\$ 728.64 + 145.63 bank charges)

SALDO EN BANCOS

\$ 874.27

NOTA::

El saldo de (Imprevistos del 5%) no Ingresaron a la Asoc. Centro Maya

Fuente: OIMT

ASOCIACION CENTRO MAYA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.)

PERIODO 12 DE AGOSTO DEL 2,008 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2,008

DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVES DE LA ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, PETEN, GUATEMALA

COMPONENTES PRESUPUESTARIO	PRESUP. OIMT	FLUJO AGO	FLUJO SEP	FLUJO OCT	FLUJO NOV	FLUJO DIC	SALDO
INGRESOS							
INGRESO	\$ 54,000.00	\$ 47,500.00					\$ 2,500.00
Fondos OIMT		\$ 4,000.00					
TOTAL DE INGRESOS	\$ 54,000.00	\$ 51,500.00					\$ 2,500.00
EGRESOS							
10 PERSONAL DEL PROYECTO							
Expertos Nacionales (3)	\$ 24,500.00						
Consultores Nacionales (2)	\$ 5,000.00						
Consulta Internacional (1)	\$ 7,500.00	\$ 25,900.00			\$ 11,100.00		\$ -
Otra Mano de Obra (5)	\$ 1,200.00			\$ 1,189.19			\$ 10.81
TOTAL COMPONENTE	\$ 38,200.00	\$ 25,900.00		\$ 1,189.19	\$ 11,100.00		\$ 10.81
20 SUBCONTRATOS							
30 VIAJES DE SERVICIO							
Viaticos	\$ 3,040.00	\$ -	\$ 891.31	\$ 1,335.69		\$ 622.98	\$ 190.02
Viajes Internacionales	\$ 700.00						\$ 700.00
Gastos de Transporte	\$ 2,160.00		\$ 717.58				\$ 134.46

50	TOTAL COMPONENTE	PRESUP. OIMT	FLUJO AGO	FLUJO SEP	FLUJO OCT	FLUJO NOV	FLUJO DIC	SALDO
	\$ 5,900.00		\$ -	\$ 1,608.89	\$ 1,335.69	\$ -	\$ -	\$1,307.96
	\$ 2,000.00		\$ 20.27	\$ 2,300.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (320.68)
	\$ 300.00			\$ 178.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.27
	\$ 2,300.00		\$ 20.27	\$ 2,479.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (199.41)
	COMPONENTES PRESUPUESTARIO							
60	GASTOS VARIOS							
	\$ 1,100.00		\$ 817.57	\$ 86.30	\$ 157.74	\$ -	\$ -	\$ 38.39
	\$ 2,500.00							\$2,500.00
	\$ 3,600.00		\$ 817.57	\$ 86.30	\$ 157.74	\$ -	\$ -	\$2,538.39
80	Admon. Control y Evaluación de la OIMT		\$ 4,000.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
100	TOTAL GLOBAL		\$ 30,737.84	\$ 4,174.33	\$ 2,682.62	\$ 11,100.00	\$ 1,930.94	\$3,374.27

SALDO DE INGRESOS \$ 51,500.00 \$20,762.16 \$16,587.83 \$13,905.21 \$2,805.21

SALDO DE EGRESOS \$ 30,737.84 \$ 4,174.33 \$ 2,682.62 \$11,100.00 \$1,930.94

DISPONIBILIDAD \$ 20,762.16 \$16,587.83 \$13,905.21 2,805.21 \$ 874.27

Nota :

Los fondos de OIMT es la administración y evaluación OIMT por valor de \$ 4,00.00

FUENTE: ASOCIACION CENTRO MAYA

ASOCIACION CENTRO MAYA

GASTOS EFECTUADOS DEL PROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.)

PERIODO 12 DE AGOSTO DEL 2008 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2008

DESARROLLO DE LA EMPRESA FORESTAL LOCAL A TRAVES DE LA ORDENACION FORESTAL SOSTENIBLE EN EL SECTOR SUROESTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDON EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, PETEN, GUATEMALA

	COMPONENTES PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO ACM US\$	EJECUCION ACM US\$	SALDO ACM
10	Personal del Proyecto			
	Expertos Nacionales (3)	\$ 5,790.00	\$ 5,790.00	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 5,790.00	\$ 5,790.00	\$ -
20	Subcontratos			
30	Viajes de Servicios			
	Viáticos	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	\$ -
40	Bienes Capital			
	Vehículos	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00	\$ -
	Equipo	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 2,460.00	\$ 2,460.00	\$ -
50	Bienes Fungibles			
	Servicios/Combustible	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
	Suministros de Oficina	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
100	TOTAL GLOBAL	\$ 10,010.00	\$ 10,010.00	\$ -

4.4 Resultados logrados

Al momento de la finalización del preproyecto, se ha elaborado una propuesta de proyecto, como fue planificado en el objetivo de desarrollo, el objetivo específico y que integra también todos los componentes de los resultados propuestos. La propuesta fue sometida a la convocatoria realizada por la OIMT a través del punto focal para Guatemala según nota PFN 180.08 de fecha 13 de noviembre de 2,008. Por tratarse de un proyecto relativamente corto, los indicadores y medios de verificación se indican en matriz del marco lógico y los mismos fueron presentados físicamente durante la visita de evaluación de la OIMT el 15 de diciembre de 2,008.

5. Análisis crítico del progreso alcanzado en el proyecto

Durante la ejecución de las actividades del preproyecto no se tuvo ningún contratiempo significativo que halla retrasado la ejecución de las mismas. La presente ejecución del preproyecto se condujo dentro de un marco de interés global de todas las comunidades involucradas, presentándose un interés por apoyar esta iniciativa.

6. Conclusiones

Indicar las conclusiones derivadas por el personal del proyecto sobre la situación alcanzada en la ejecución del mismo, en base al análisis crítico del progreso más reciente.

La ejecución del preproyecto condujo a las siguientes conclusiones:

- a) **Marcado interés de las comunidades por tener actividades comerciales sostenibles derivadas de los planes de manejo actuales de sus organizaciones**
- b) **Decidida participación en una industria forestal local que genere valor agregado a sus productos**
- c) **Gran Potencial de la Industria local para realizar procesos de transformación**
- d) **Deseo de las comunidades por diversificar las fuentes comerciales de sus productos**
- e) **La comunidades se muestran interesadas en darle un manejo industrial a los desechos**
- f) **Plena conciencia de las comunidades en conservar el recurso forestal si este genera un valor económico para sus comunidades.**
- g) **Necesidad de consolidar procesos de Seguimiento y Evaluación de los diferentes procesos.**
- h) **Identificación de nuevas formas de enriquecer el recurso Forestal maderable y no maderable.**
- i) **Necesidad de explorar la industria forestal local para innovar con nuevos productos e inversionistas nacionales e internacionales.**
- j) **El 100 % de los entrevistados manifestó que tiene interés de integrar o formar parte de una empresa o industria forestal que se impulse en la región para aprovechar mejor y más racionalmente todos los productos y subproductos del bosque y mejorar sus ingresos familiares.**
- k) **De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico: Socioeconómico, Empresariales y de Capacidad Productiva de las organizaciones potenciales para integrar la Empresa Forestal Local, son: **Cooperativa Unión Maya Itzá, La Técnica Agropecuaria, Bethel, La Lucha, Monte Sinal, El Arbolito, Flor de la Esperanza, IXmucané, Los Laureles, Parcelamiento Retalteco, Unac, Caserío la Bendición****
- l) **De acuerdo al análisis realizado existen condiciones apropiadas para fortalecer la empresa forestal comunitaria en la zona del Parque Nacional Sierra del Lacandón y comunidades circunvecinas.**
- m) **Dada las capacidades productivas diagnosticadas en la zona, se presentan las condiciones para iniciar un proceso de negocios integrado con todas las**

- organizaciones locales para aprovechar las economías de escala y satisfacer las demandas de volumen, calidad y constancia de entrega.
- n) Es sumamente necesario estructurar la empresa basada en estructuras funcionales con sus respectivos controles administrativos, financieros y contables transparentes.
 - o) La empresa debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación que controle y regule todas las operaciones de ordenación forestal en las UFOs de la comunidades y que garanticen el suministro de insumos para la generación de valor agregado y los ingresos a la empresa.
 - p) Es necesario implementar componentes transversales dentro de la empresa forestal comunitaria como: Seguimiento y Evaluación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, Proyecciones y Métodos de Inventarios Forestales, y Prácticas de Aprovechamiento Forestal.
 - q) Los productos Forestales no maderables representan un gran potencial de negocios en el mediano plazo (3 años).

7. Funcionario responsable del informe


Nombre: ~~Carlos Adolfo Gollado Martínez~~

Cargo: Presidente
Asociación Centro Maya



Fecha: 3 de Febrero del 2,009

Anexo: Informe Contables.

ASOCIACION CENTRO MAYA
ANTEPROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I,M)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO 2008 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2008
Cifras en Quetzales

VENTAS DEVOLUCIONES Y COSTOS			
VENTAS NETAS			
			\$ 47,500.00
VENTAS NETAS			\$ 47,500.00
INGRESOS VARIOS			\$ 47,500.00
Ingreso de Proyectos PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.)			\$ 47,500.00
GASTOS			
GASTOS DE ADMON.Y OPERACION			\$ 46,683.21
10 Personal del Proyecto			\$ 38,189.19
Expertos Nacionales (3)			
Consultores Nacionales (2)			
Consulta Internacional (1)			
	\$ 37,000.00		
Otra Mano de Obra (5)			
	\$ 1,189.19		
<hr/>			
20 Subcontraros			\$ 4,928.00
30 Viajes de Servicios			
Viaticos			
	\$ 2,902.46		
Viajes Internacionales			
	\$ -		
Gastos de Transporte			
	\$ 2,025.54		
<hr/>			
50 Bienes Fungibles			\$ 2,499.41
Servicios/combustible			
	\$ 2,320.68		
Suministros de Oficina			
	\$ 178.73		
<hr/>			
60 Gastos Varios			\$ 1,066.61
Gastos Diversos			
	\$ 1,066.61		
Imprevistos (5% de Costos totales)			
	\$ -		
<hr/>			
70 Admon, Control y Evaluacion de la OIMT			\$ -
<hr/>			
100 Saldo Por Ejecutar			<u>\$ 816.79</u>

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -S-A-T BAJO EL NUMERO 077749 CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADO DEL ANTEPROYECTO PPD 117/05Rev. 2 (I.M.) ASOCIACION CENTRO MAYA DEMUESTRA SALDO POR EJECUTAR OCHOCIENTOS DIOEZ Y SIES DOLARES CON 79/100 (\$ 816.79) A LA FECHA CITADA
 Santa Elena , Peten 11 de Diciembre del 2,008


 Contador General


 Tesorero Junta Directiva


 Presidente y Junta directiva

ASOCIACION CENTRO MAYA
ANTEPROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I,M)
BALANCE DE GENERAL
AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,008

ACTIVO			\$816.79
<u>CIRCULANTE</u>			
<u>CAJA Y BANCOS</u>			\$816.79
<u>BANCOS</u>		\$816.79	
Banrural / Asociacion Centro Maya/OIMT/PPD 11	\$	<u>816.79</u>	
TOTAL CAPITAL			\$816.79
Utilidad (Perdida) del Ejercicio			\$816.79
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL			<u><u>\$816.79</u></u>

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -S-A-T- BAJO EL NUMERO 077749 CERTIFICA: QUE EL BALANCE GENERAL DEL ANTEPROYECTO PPD 117/05 Rev. 2 (I.M.) ASOCIACION CENTRO MAYA PRACTICADO EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,008 DEMUESTRA RAZONABLEMENTE SU SITUACION FINANCIERA.

Santa Elena, Petén 11 de Diciembre del 2,008


Contador General ACM


Presidente y Representante Legal

Vo.Bo.


Tesorero Junta Directiva

ASOCIACION CENTRO MAYA

SALDO DE BANCOS OIMT

Q6,044.20 \$ 7.40 = \$ 816.79

Q6,044.20 \$ 8.02 = \$ 753.64 (-) \$ 25.00 \$ 728.64 Reintegro a la OIMT

Diferencia \$ 0.62

BANRUAL

SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 20/100

46

ASOCIACION CENTRO MAYA
3144036480

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DEBE	VALOR HABER
5110404	Ingresos de Proyectos	6,044.20	
1110319	Banrural OIMT-ACM		6,044.20
Total de la Partida ==>		6,044.20	6,044.20

Reintegro de los fondos de OIMT Cuneta No. 6304224


ELABORO:



REVISADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

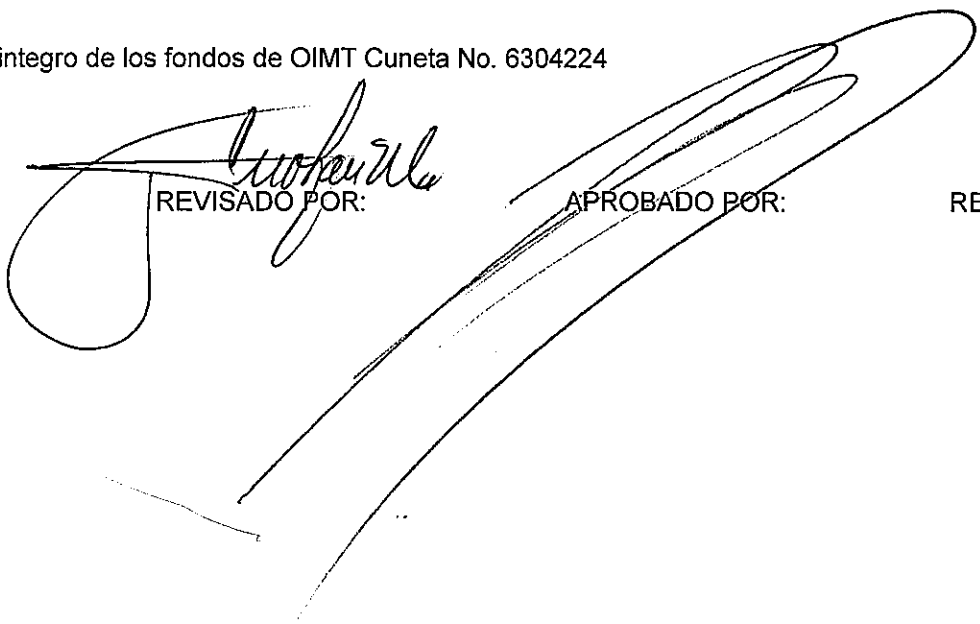

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

CODIGO DE OPERACION : 351919

DATOS DEL BANCO

FECHA DE PAGO : SAN BENITO, 1 29 2009
AGENCIA : 144 - SAN BENITO PETEN
USUARIO AUTORIZANTE : aaae

DATOS DEL ORDENANTE

ORDENANTE : ASOCIACION CENTRO MAYA

DATOS DE TRANSFERENCIA

NUMERO DE CUENTA : 6304224
BENEFICIARIO : INTERNACIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO)
DIRECCION DE BENEFICIARIO :

BANCO PAGADOR : CITIBANK, N.A.
DIRECCION BANCO PAGADOR : FIFTH AVENUE FINANCIAL CENTER 640 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10019 U.S.A.
SWIFT o ABA PAGADOR : 021000089

BANCO INTERMEDIARIO :
SWIFT o ABA INTERMEDIARIO :
CUENTA INTERMEDIARIO :


REFERENCIAS DE PAGO : REINTEGRO DE FONDO DE CONSULTORIA
GASTOS A CARGO DE : BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

DATOS DEL MONTO

MONEDA : DOLARES AMERICANOS
VALOR EN MONEDA DE TRANSF. : 728.64
EQUIVALENTE EN DOLARES : 728.64
TIPO DE CAMBIO DOLAR/QUETZAL : 8.02
TIPO CAMBIO OTRA MONEDA/DOLAR : 1

BANRURAL, no asume ninguna responsabilidad por la falta de información, dirección incorrecta, números de cuenta, números de ruta, nombres de Bancos en el exterior, monto, referencias o cualquier dato consignado incorrectamente en las instrucciones anteriores. La transferencia cablegráfica se envía de acuerdo a las Instrucciones recibidas del ORDENANTE. El ORDENANTE asume todos los gastos y comisiones cobrados localmente o en el exterior, por errores o por información proporcionada incorrectamente en este formulario, el cual podrá ser deducido del valor original enviado. Cualquier inconveniente o atraso por información mal consignada en éste formulario, exime a BANRURAL de toda responsabilidad.

FIRMA DEL REMITENTE :



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: SAN BENITO PETEN

Número de Cuenta ...: 3-144-03648-0

Fecha : 14/01/2009

Nombre de la Cuenta : ASOCIACION CENTRO MAYA/OIMT/PPD 117-05

Hora : 16:20:05

Dirección: BARRIO EL TREBOL, SAN BENITO, PETEN.

Moneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 30/11/2009

Fecha próx. corte: 31/12/2008

Saldo últ. corte: 19,543.70

Fecha últ. mov. : 10/12/2008

Periodo desde : 01/12/2008 hasta : 31/12/2008

Saldo Inicial : 19,543.70

CHA	REF.	LUGAR	No. DOCTO.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	HORA
03/12/2008	41	33		PAGO DE CHEQUE	-	2,110.00	17,433.70	17,433.70	15:33:24
09/12/2008	42	153		RECEPCION DE CHEQUES PROPIOS	-	2,500.00	14,933.70	14,933.70	10:09:35
12/2008	43	144		PAGO DE CHEQUE	-	5,000.00	9,933.70	9,933.70	14:31:14
12/2008	44	320		PAGO DE CHEQUE	-	3,464.00	6,469.70	6,469.70	15:06:26

Handwritten signature: *[Signature]*

Circular stamp: BANCO DE DESARROLLO RURAL, AGENCIA DE SAN BENITO, GERENTE DE AGENCIA

ASOCIACION CENTRO MAYA

PETEN - GUATEMALA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,008
ACM/GENERACION DE TEGNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MACAL

Saldo al mes de Diciembre 2,008	<u>BANCO</u> Q6,469.70	<u>LIBROS</u> Q6,044.20
---------------------------------	---------------------------	----------------------------

CHEQUES EN CIRCULACION

10 Hugo Gilberto Chan Mis	45	Q425.50
---------------------------	----	---------

Q425.50

Q6,044.20


Q6,044.20

Elaboro:

[Signature]
Ariel Montero
Contador

[Signature]
Vo.Bo. Gonzalo Andres Ochaeta
Gerente General

*Risoldo
Lopez*



ASOCIACION CENTRO MAYA

PETEN - GUATEMALA

MOVIMIENTO DEL BANCO MES DE DICIEMBRE 2,008

CUENTA No. 3-144-036480 ACM/ASOCIACION CENTRO MAYA /OIMT/PPD 117-05

MES	DIA	NOMBRE COMPLETO	No. CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
Novi.	13	Saldo Anterior		Q19,543.70		Q19,543.70
Dic.	2	Carlos Colado Martinez	41		Q2,110.00	Q17,433.70
"	5	Carlos Colado Martinez	42		Q2,500.00	Q14,933.70
"	10	Servi Trans	43		Q5,000.00	Q9,933.70
"	10	Maria concepción Roman Tzul	44		Q3,464.00	Q6,469.70
"	10	Hugo Gilberto Chan Mis	45		Q425.50	Q6,044.20
TOTAL				Q19,543.70	Q13,499.50	Q6,044.20

Santa Elena, Petén, 30 de Noviembre 2,008

Elaboro:

[Signature]
Axel Osvaldo Montero
Contador General
Asociación Centro Maya

Vo.Bo.

[Signature]
Gonzalo Andres Ochaeta
Gerente General
Asoc. Centro Maya

